

Согласовываю
Начальник ПТО ООО «ССК»
/Ставерский А.В.
« » _____ 2021 года


**Заявка на выполнение работ № 4 (В)
Устройство ограждения строительной площадки.**

1. **Объект:** «Школа на 800 мест в п. Тазовский Тазовского района, ЯНАО».
2. **Вид работ:** Подготовительные работы.
3. **Место выполнения работ:** Поселок Тазовский, Тазовского района, Ямало-Ненецкого Автономного округа.
4. **Перечень работ:** Комплекс работ по устройству ограждения строительной площадки.
5. **Сроки выполнения работ:** работы выполнить с 15.05.2021 г. по 29.05.2021 г.
6. **Основной состав и объём работ:** Объёмы работ: - Установка ограждения (с двумя воротами и калитками) периметр земельного участка 630 метров, высота ограждения 2 метра, столбы – профиль металлический квадратного сечения 100ммх100мм., связи профиль металлический 20мм.х40мм., материал секций ограждения – лист профильный.
7. **Стоимость работ:** договорная.
8. **Оплата работ:** Производится при условии качественного выполнения полного объёма работ.
9. **Иные условия:**
 - Работники должны иметь гражданство РФ или право на работу в РФ, согласно законодательству для иностранных граждан.
 - Проживание: организуем проживание, оборудованное койко-местами (кровать, матрас, одеяло, подушка). Постельное белье не предоставляется. Уборка места проживания осуществляется самостоятельно.
 - Питание – организуется самостоятельно.
 - Механизмы и оборудование – строительными подмостями, инструментом, а также иными механизмами и оборудованием, необходимым для производства работ, подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.
 - На строительном объекте должен постоянно находиться ИТР (мастер, прораб) подрядной организации.
 - На строительном объекте должен постоянно находиться геодезист подрядной организации.
 - Допускается совмещение ИТР и геодезиста в одном лице.
 - Обязательно наличие паспортов/сертификатов качества на применяемый материал.

Инженер ПТО ООО «ССК»


_____ Попов О.М. (28.04.2021 г.)

Вид сверху

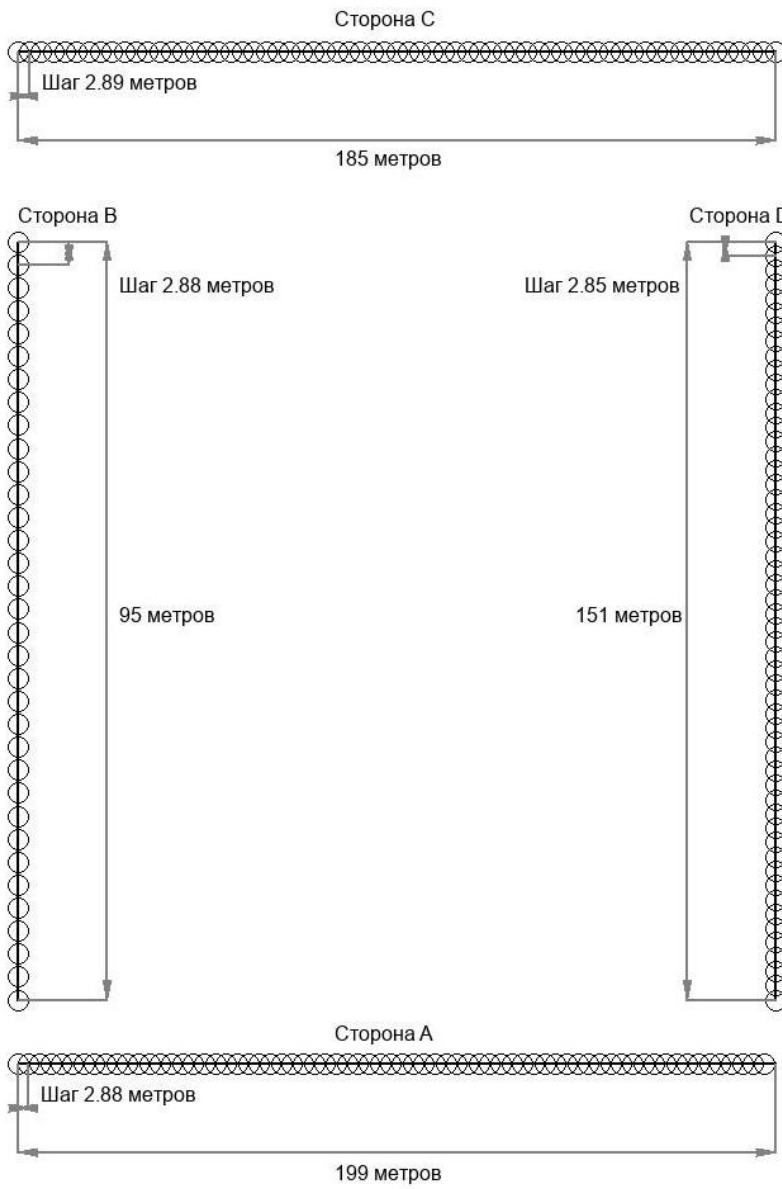

Вид сбоку



